HARMONOGRAM PRACÍ

(AKTUALIZACE pracovní verze 30.1.2018)

Stavba **348 - Přeložka silnice I/37 Sklené nad Oslavou - obchvat**

Přerušení prací

Objekt	Popis
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady
SO 000.1	Přípravné práce pro zhotovení základní vytyčovací sítě
SO 001	Příprava území
SO 101-1	Silnice I/37
SO 101-2	Propustky a norné stěny
SO 101-3	Úprava užitkového vodovodu v km 1,226
SO 102-1	Napojení obce Sklené nad Oslavou
SO 102-2	Dopravní značení
SO 102-3	Propustky
SO 103-1	Místní komunikace k žst. Sklené nad Oslavou
SO 103-2	Propustek P12 DN1000 v km 0.016 60
SO 104	Úprava stávající místní komunikace k žst. Sklené nad Oslavou
SO 105-1	Úprava sjezdu
SO 105-2	Propustek P5 DN 600 v km 0.006
SO 107	Polní cesta II
SO 108-1	Polní cesta III
SO 108-2	Propustek P10 DN800 v km 0.238
SO 109	Polní cesta IV
SO 110	Polní cesta V
SO 111-1	Úprava místní komunikace
SO 112	Těleso hráze v prostoru rybníků "Silnice" a "Babák"
SO 113	Chodník podél místní komunikace k žst. Sklené nad Oslavou
SO 114-1	Chodníky k autobusovým zastávkám
SO 114-2	Propustek P1 DN400 v km 0.030 - vlevo
SO 115	Dopravní opatření
SO 116	Dopravní značení
SO 201	Most přes meliorační potok v km 0.494
SO 202	Most přes místní komunikaci v km 1.302
SO 203-1	Most v km 1.678 přes silnici I/37 a železniční trať
SO 203-2	Demolice stávajícího mostu
SO 203-3	Úprava trakčního vedení železnice
SO 204	Zárubní zeď silnice I/37
SO 301	Dešťová kanalizace - odvodnění silnice I/37
SO 381	Bezpečnostní přeliv rybníka „Silnice"
SO 382	Vypouštěcí zařízení rybníka „Silnice"
SO 383-1	Úprava melioračního potoka v km 0,505
SO 383-2	Propustky
SO 431	VO chodníku podél místní komunikace k žst. Sklené nad Oslavou
SO 432	VO chodníků k autobusovým zastávkám
SO 451-SO 454	Přeložky a ochrana SEK CETIN, a.s.
SO 501	Přeložka STL plynovodu PE 63 JMP,a.s. v km 1,297
SO 502	Přeložka STL plynovodu PE 90 JMP,a.s. v km 1,681
SO 651-1	Vyčištění drážního příkopu
SO 652	Přeložka sloupové transformovny ČD
SO 653	Přeložka kabelu 6 kV v km 0.042 - 0.140 polní cesty III
SO 654	Přeložka kabelu 6 kV v km 1.230 - 1.886
SO 655	Přeložka kabelu nn pro žst. Sklené nad Oslavou
SO 701	Protihluková opatření
SO 702	Rekonstrukce oplocení č.1
SO 703	Rekonstrukce oplocení č.2
SO 705	Rekonstrukce oplocení č.4
SO 706	Rekonstrukce oplocení č.5
SO 707	Obslužné zařízení rybníku „Silnice"
SO 801	Rekultivace
SO 802	Vegetační úpravy silnice I/37
SO 803	Vegetační úpravy místních komunikací a chodníků
SO 804	Vegetační úpravy hráze rybníků „Silnice" a „Babák"
SO 805	Vegetační úpravy – ZVHS

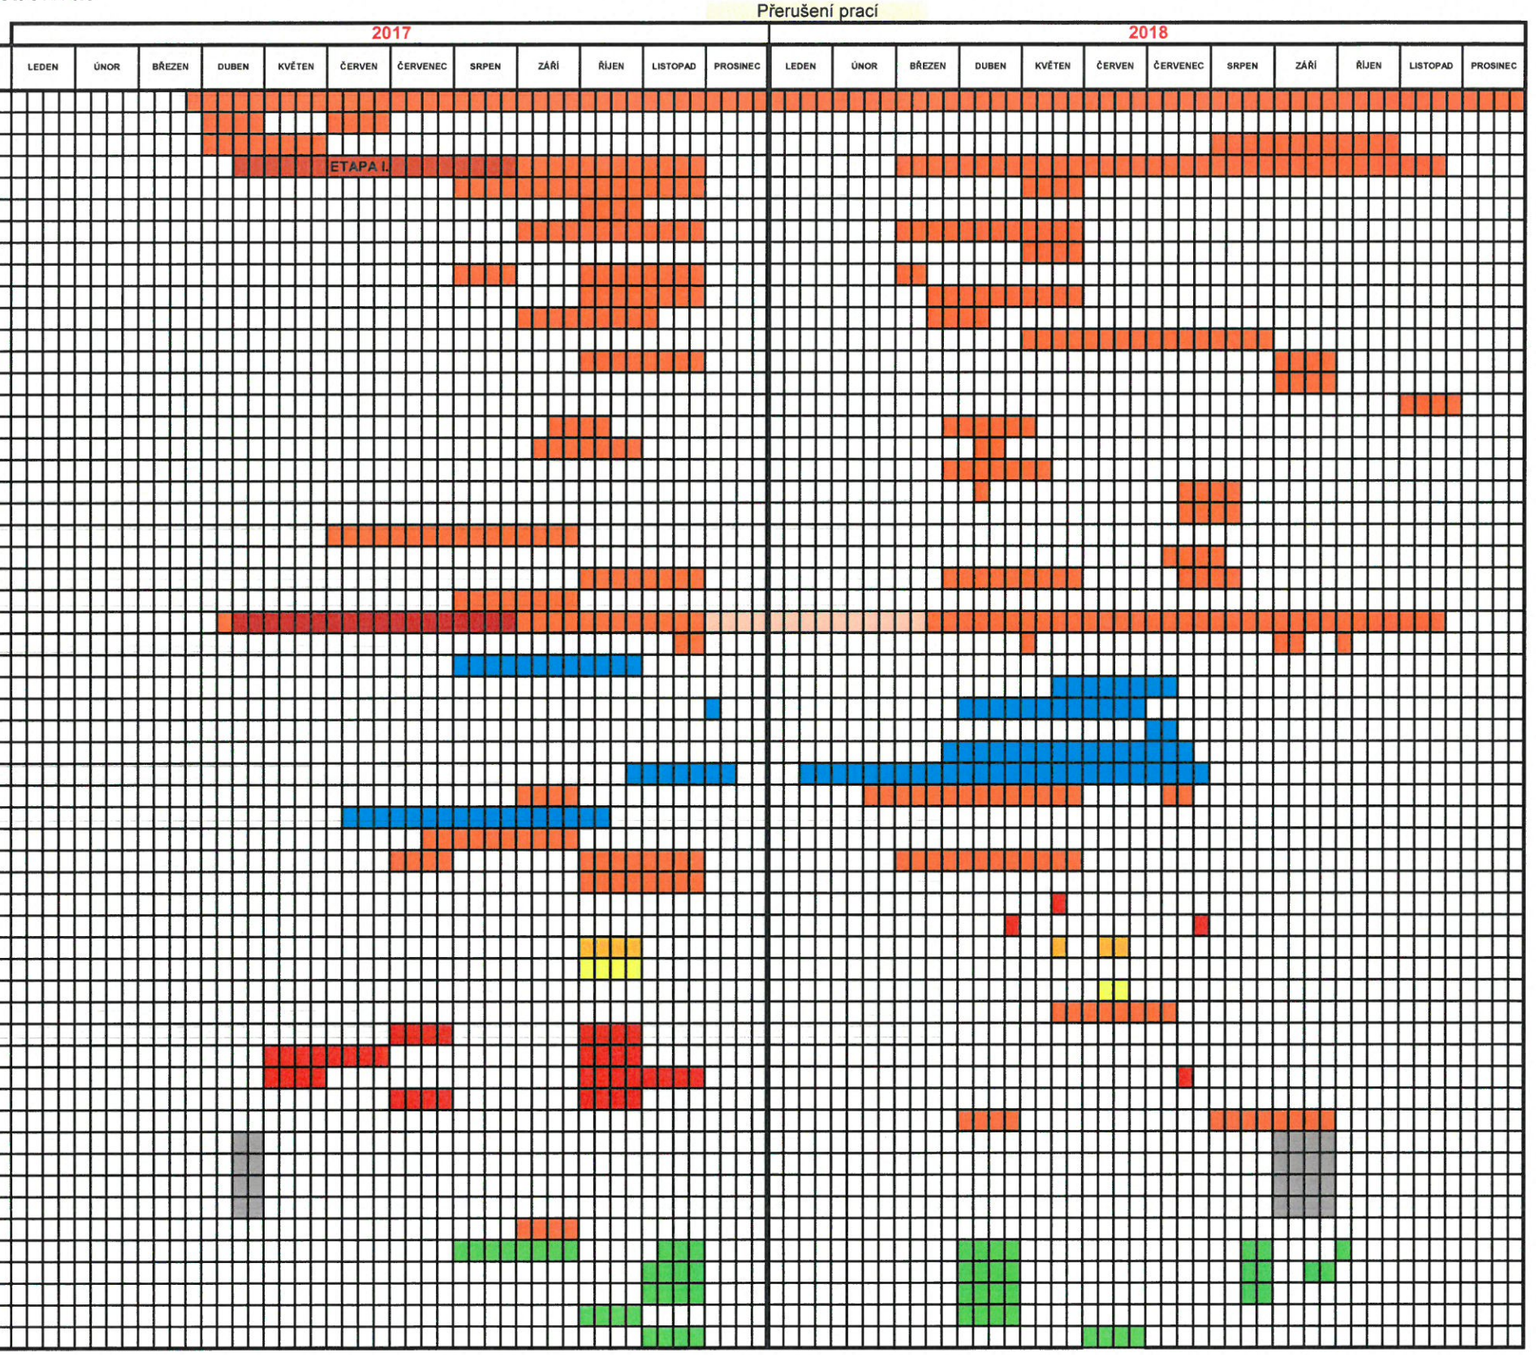

SO 115 - úplná uzávěra 18.4.-15.9.2017

SO 654 I.ETAPA km 1,4 - 1,9
II.ETAPA km 1,25 - 1,40

30 -01- 2018

OHL ŽS 392
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS, a.s.
Bronislav VÁŽAN
